NYHETSBREV No2

Hänt i projekt Ombyggnad Tjärna Centrum

MAJ 2026

Arbetena på Harven 1 fortsätter enligt plan!

Efter en intensiv rivningsfas har arbetena nu övergått till uppbyggnad av nya konstruktioner och förberedelser för kommande installationer.

Under maj månad har arbetena fortsatt med stomkomplettering av ytterväggar, brandförstärkning av takkonstruktionen samt kompletteringar och tilläggsisolering på insida ytterväggar. I källarplanet har vi påbörjat montage av innerväggar, medan nya pelare har monterats på markplan. Under månaden har även samtliga saneringsarbeten färdigställts, vilket innebär att projektet kan gå vidare enligt plan med kommande produktionsskeden.

För att möjliggöra kommande ventilationsinstallationer har nya genomföringar tagits upp i taket, inklusive erforderliga avväxlingar med limträ för framtida ventilationshuvar. Miljönären har genomfört dammsugning och höjdsättning av markplan inför kommande golvspackling, medan Betongteamet fortsatt med håltagningar för installationer.

Utvändigt har markentreprenaden startat upp med arbeten på fastighetens framsida inför den nya entrén med trappa och gradäng. Även arbeten med ny VA-anslutning pågår.

Projektet fortsätter nu i högt tempo och vi ser fram emot nästa nya moment i utvecklingen av Tjärna centrum.

Innerväggar i omklädningsrum källaren

Ny pelarrad monterade på gjutna fundament

Hänt i projektet Ombyggnad Tjärna centrum

MAJ 2026

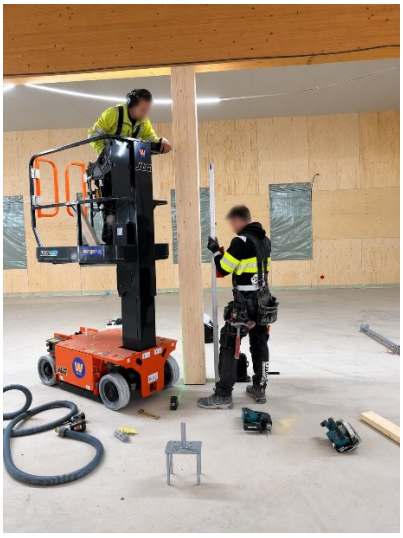

Montage limträpelare

Schaktning och anslutning ny inkommande vatten/avlopp

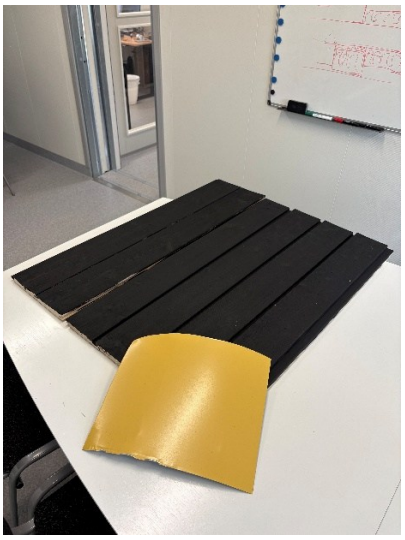

Panel och färgprover

Insida ytterväggg och brandförstärkt tak på markplan

Vad händer den kommande månad?

Under juni kommer fokus ligga på att färdigställa innerväggarna i källaren så att ventilationsentreprenören kan påbörja kanaldragning. Vi kommer även att spackla golven på markplan och i källaren.

Utvändigt fortsätter markarbetena med rivning av befintlig asfalt samt höjdsättning av parkeringsytorna inför kommande asfaltering och färdigställande av den nya parkeringen.

Vilka är på plats?

Dala Byggsamverkan: elva snickare. Mega El: två elektriker, Betongteamet: två håltagare, Miljönären golv: två golvspacklare, PEAB anläggning: en maskinist & en ”spadgubbe”
