NYHETSBREV No4

Hänt i projekt Ombyggnad Tjärna Centrum

AUGUSTI 2026

Ny gradäng och utvändig trapp

Centrumbyggnad är tillbaka efter semestern!

Efter semesterperioden är produktionen på Harven 1 åter i full gång. Under semestern höll ett mindre antal träarbetare, elektriker och markarbetare produktionen igång, och från vecka 32 var de flesta yrkesgrupper tillbaka med full kraft.

Sedan senaste nyhetsbrevet har byggarbetena fortsatt i hög takt. Mellanväggarna är nu i princip färdigställda och takfoten brandförstärks samt kompletterats med en ny sarg av Swisspearl fasadskiva. Montage av fönster, fönsterbänkar och smygar har påbörjats och arbetet med brandförstärkning av taket i den disponibla ytan fortsätter. Även målaren har nu fått komma igång och har påbörjat det invändiga arbetet med spackling och målning.

Brandförstärkning takfot

Spacklade och målade kontorsväggar

Fönstermontage

Hänt i projektet

APRIL 2026

På installationssidan har elentreprenören påbörjat montage av kabelstegar, brandlarm samt armaturer i takfoten.

VS arbetar med rörstråk på båda planen och har svetsat ihop den nya inkommande fjärrvärmen fram till fjärrvärmemaskinen. Även kulvert till kylmaskinen har lagts.

Ventilationen har fortsatt med kanaldragning i källaren och dragit upp kanaler genom schakten för att nu fortsätta arbetena på plan 2.

Utvändigt har markarbetena tagit stora steg framåt. Den nya parkeringen på framsidan har asfalterats och kantsten har monterats, samtidigt som gavel syd har förberetts för kommande asfaltering.
Den nya gradängen och utvändiga trappan är monterade och stenläggningen av entrétorget har påbörjats.

Under månaden hade vi även nöjet att välkomna kommunens politiker på studiebesök. Tillsammans med representanter från Kommunfastigheter och platschef Micke fick de möjlighet att se hur projektet fortskrider och ta del av arbetet på plats.

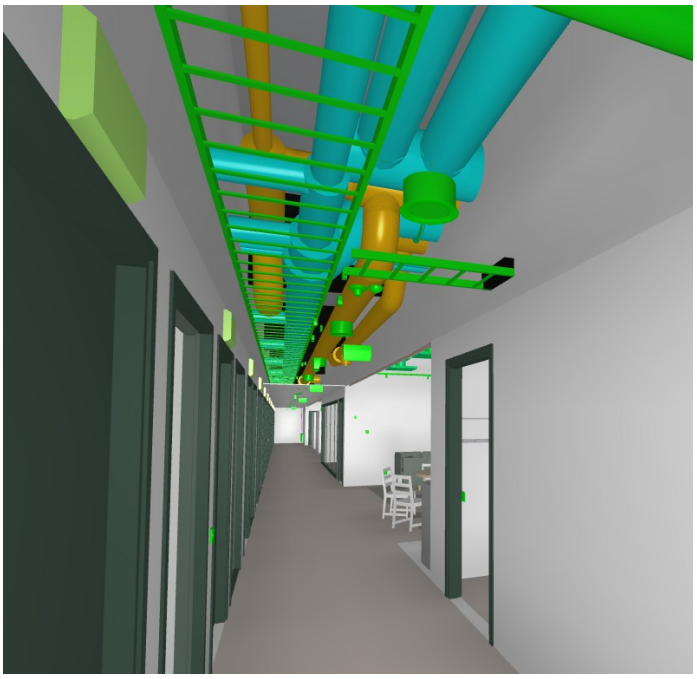

Ovan bilder visar kanaldragning i schakt samt 3D-bild på installationstät korridor

Vad händer den kommande månad?

Under kommande månad fortsätter arbetena invändigt med fönstermontage och listverk. Utvändigt fortsätter brandförstärkningen av takfoten och arbetet med glesning och panel påbörjas. Installationerna fortsätter att byggas upp och målaren påbörjar målning av fasaden.

Vilka är på plats?

Dala Byggsamverkan: tretton snickare. Mega El: fem elektriker, Dalab: en till två rörmokare, Bravida: fyra ventilations montörer, PEAB anläggning: fyra markarbetare, STICAB: två isolerare, TM Ställning: två ställningsbyggare
